


Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	13. Mrz	10. Apr	08. Mai	05. Jun	03. Jul	31. Jul	28. Aug	25. Sep	23. Okt	20. Nov	18. Dez	15.
1	Beauftragung Planungsleistung	1 Tag	Mo 29.05.17	Mo 29.05.17		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Grundlagen und Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) - Erarbeiten der wesentlichen Teile einer Lösung der Planungsaufgabe / Bestandsaufna	14 Tage	Di 30.05.17	Fr 16.06.17	1												
3	Entwurfsplanung - Erarbeiten der endgültigen Lösung	15 Tage	Mo 19.06.17	Fr 07.07.17	2												
4	Abstimmung der Entwurfsplanung mit Bauherren und ggf. Änderungen vornehmen	5 Tage	Mo 10.07.17	Fr 14.07.17	3												
5	Ausführungsplanung - Erarbeiten und Darstellen der ausführungsfähigen Planungsleistung auf Grundlage der Entwurfsplanung	20 Tage	Mo 17.07.17	Fr 11.08.17	4												
6	Abstimmung der Ausführungsplanung mit Bauherren und ggf. Änderungen vornehmen	5 Tage	Mo 14.08.17	Fr 18.08.17	5												
7	Vorbereitung der Vergabe - Ermitteln der Mengen und Aufstellen von Leistungsverzeichnissen auf Grundlage der Ausführungsplanung	10 Tage	Mo 21.08.17	Fr 01.09.17	6												
8	Laufzeit der Angebote - Submission	15 Tage	Mo 04.09.17	Fr 22.09.17	7												
9	Prüfen der Angebote und Mitwirkung bei der Auftragsvergabe	3 Tage	Mo 25.09.17	Mi 27.09.17	8												
10	Auftragserteilung	2 Tage	Do 28.09.17	Fr 29.09.17	9												
11	Objektüberwachung (Bauüberwachung) - Überwachen der Ausführung, Abnahme und Rechnungsprüfung	3 Monate	Mo 02.10.17	Fr 22.12.17	10												
12	Bauabnahme	4 Tage	Di 02.01.18	Fr 05.01.18	11												

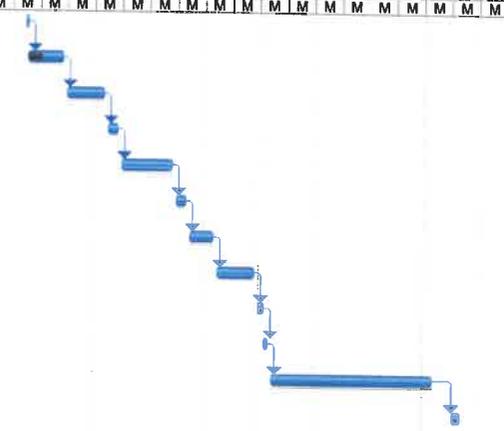

Anlage 3)

Projekt: E50te001	Vorgang		In Arbeit		Sammelvorgang		Externe Vorgänge		Stichtag	
	Unterbrechung		Meilenstein		Projektsammelvorgang		Externer Meilenstein			
